

Kommission:	
Objekt:	
Strasse / Ort:	
Menge:	Stk.

Anfrage: ☐ Bestellung: ☐

Bausatz 2-teilig	☐	(Platzschweissung durch Liebi)
Bausatz 3-teilig	☐	(Platzschweissung durch Liebi)
Bausatz 4-teilig	☐	(Platzschweissung durch Liebi)
Kleinste Einbringöffnung		mm (b x h)

Betriebsdruck		bar (3 bar Standard)
Prüfdruck:		bar (4,5 bar Standard)
min./max. Betriebstemp.:		°C / °C
Stutzenlänge:		mm
Inhalt:		Liter
Durchmesser:		mm
Höhe über Boden (HB):		mm
Gesamthöhe:		mm
Raumhöhe:		mm
Grundierung Standard:	☐	innen roh / aussen mit Korrosionsschutzfarbe
Grundierung andere:	☐	


[illegible]

10 Stk. Muffen bis 2" sind inklusive


Mannloch	NW 350	
	NW 400	
	NW 500	

Lieferadresse:	
Firma / Objekt:	
Strasse / Ort:	
Tel:	

Lieferdatum:

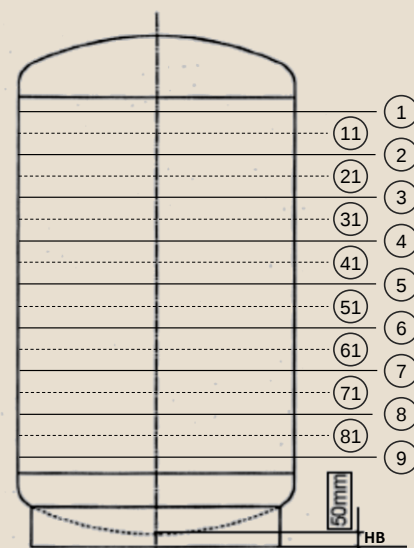

HB => Höhe über Boden (min. 50 mm)

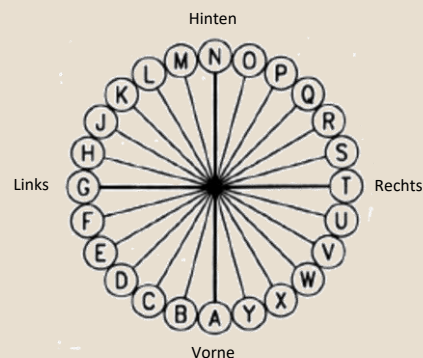

Firma / Zuständig:	
Strasse / Ort:	
Tel:	
E-Mail:	
Datum:	

Material:	St37.2 (Schwarzstahl)	☐ (Standard)
	1.4571 (Edelstahl V4A)	☐
	1.4301 (V2A)	☐

Auflage:	Standring	☐ (Standard)
	Rohrfüsse	☐
	UNP-Füsse	☐
	Liegende Stützen	☐

Isolation	100 mm	☐	
	130 mm	☐	
	160 mm	☐	
	ohne	☐	

Integralboiler: (Anschlüsse: KW 1½" / WW 1" / Zirk. ½")	180 Liter	Ø 600 mm / h: 710 mm	☐
	220 Liter	Ø 650 mm / h: 760 mm	☐
	220 Liter	Ø 900 mm / h: 490 mm	☐
	270 Liter	Ø 700 mm / h: 790 mm	☐
	320 Liter	Ø 700 mm / h: 950 mm	☐
	320 Liter	Ø 900 mm / h: 650 mm	☐
	430 Liter	Ø 900 mm / h: 790 mm	☐
	510 Liter	Ø 800 mm / h: 1140 mm	☐
	750 Liter	Ø 950 mm / h: 1210 mm	☐
	1000 Liter	Ø 1100 mm / h: 1200 mm	☐
Reinigungsflansch PN 6/10:	1.4404	DN 150	

TopSol (Vorwärmetauscher zu Integralboiler):	1,2 m²	1¼"	☐	
	1,8 m²	1¼"	☐	
	2,4 m²	1¼"	☐	
	3,6 m²	1¼"	☐	

Glattrohr-WT:	1,2m ²	(8,7 Liter Inhalt)	☐
	1,8m ²	(13,0 Liter Inhalt)	☐
	2,4 m ²	(17,5 Liter Inhalt)	☐
	3,6m ²	(26,0 Liter Inhalt)	☐
	4,2m ²	(30,5 Liter Inhalt)	☐
	4,8m ²	(34,8 Liter Inhalt)	☐



Ausführung niedrig gewendet (Mehrpreis)	☐
Ausführung doppelt gewendet (Mehrpreis)	☐

Bemerkungen:
